

# 20.12.2020 – Realizacja prac na koniec roku 2020


**Informacja z realizacji prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych w Kalwarii Pacławskiej wnętrza kościoła i czterech kaplic na dzień 20 grudnia 2020r.**


W IV kwartale br. w ramach prowadzonych prac konserwatorskich wykonano:

1. Transept malowidła ściennie – w 34 %.
2. Drzwi i odrzwia front i boczne – w 100 %
3. Konfesjonały 6 szt. – 15 %
4. Kaplica Ukrzyżowania ołtarz – 31 %
5. Kaplica Domek Matki Bożej ołtarz – 43 %
6. Kaplica Domek Matki Bożej – elewacja 15 %

Wartość wykonanych prac konserwatorskich w IV kw. 2020r wynosi – 467 014,02zł.

Wartość prac konserwatorskich od początku realizacji projektu wynosi – **4 023 805,42 zł** co stanowi **80,73%**

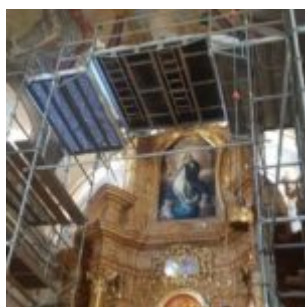

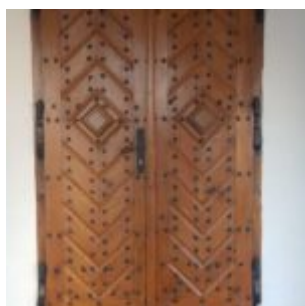

**Informacja z realizacji prac budowlanych w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy) i budynkach gospodarczych na dzień 20 grudnia 2020r.**

W ramach prowadzonych robót budowlanych w dawnych budynkach gospodarczych wykonywano nowe konstrukcje i pokrycia dachów, obicia ścian i poddasza trzeciego segmentu budynku, wyposażono w budynku kotłownię centralnego ogrzewania.

W budynku dawnego nowicjatu wykonano wymianę więźby dachowej oraz pokrycia dachu, wymianę stropów i ścian działowych.  
Wartość wykonanych robót budowlanych w IV kw. 2020r wynosi – 1 463 700,00 zł.  
Wartość robót budowlanych od początku realizacji projektu wynosi –  
**6 428 423,61** zł co stanowi **47** %.





