

Informacja z realizacji prac konserwatorskich na dzień 31.03.2021r

W ramach prowadzonych prac konserwatorskich wykonano następujące dekoracje malarskiej i wyposażenia wnętrza kościoła:

1. Prezbiterium – Malowidła ściennie – 71%.
2. Transept – Malowidła ściennie – 100%.
3. Dawna zakrystia – Malowidła ściennie -100%.
4. Stalle w 100%.

Prace konserwatorskie wykonywane przy kaplicach:

1. Kaplica Ukrzyżowania – Ołtarz – 100%.
2. Ołtarz Kaplicy św. Rafała – Ołtarz – 48%.

Wartość wykonanych prac konserwatorskich w I kw. 2021r. wynosi – 461 175,30 zł brutto.

Wartość wykonanych prac od początku realizacji inwestycji wynosi 4 484 980,72 zł brutto co stanowi 89,99% całości zadania.

Informacja z realizacji prac budowlanych w budynku dawnego nowicjatu (kamienicy), budynków gospodarczych i elewacji kościoła i klasztoru na dzień 31.03.2021r.

W ramach prowadzonych robót budowlanych na w/w budynkach w I kwartale 2021r. wykonano:

- pokrycia dachowe na budynkach gospodarczych i kamienicy,
- malowanie okładzin ścian stropów,
- częściowej elewacji,
- roboty wykończeniowe w piwnicach,
- roboty wykończeniowe parter, piętro, poddasze,
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
- częściowe pokrycia dachów,
- roboty sanitarne w wymiennikowni.

Wartość wykonanych robót budowlanych od początku realizacji inwestycji:



- budynek kamienicy – 5 411 975,4 zł brutto co stanowi 61% całości zadania,
- budynki gospodarcze – 2 752 112,28 zł brutto co stanowi 56% całości zadania,
- kościół, klasztor – 165 954,68 zł brutto co stanowi 10% całości zadania.

Zdjęcia z realizacji prac konserwatorskich







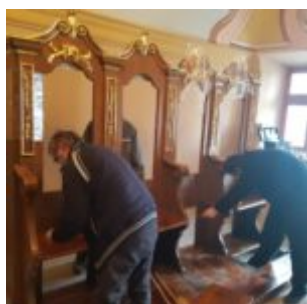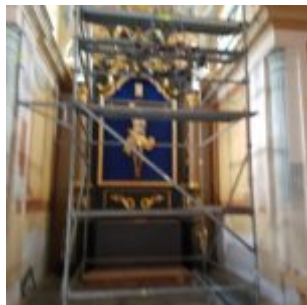



Zdjęcia z realizacji prac budowlanych



